Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης «Νέων Γεωργών» από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Αθανάσιος Μπουρλέτσικας, MSc, Δασολόγος
Διευθυντής Αγροτικής Κατάρτισης
Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, από τον Μάρτιο και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης, υλοποίησε ένα τεράστιο έργο που αφορούσε στην κατάρτιση 10.456 «Νέων Γεωργών».

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις», για τους δικαιούχους της 2ης προκήρυξης του Μέτρου 112 «Ενισχύσεις για νέους γεωργούς», όπως αυτοί εντάχθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 και συνεχίζονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 06 του ΠΑΑ 2014-2020, στο μέτρο 1 «Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020, ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ ορίσθηκε ως αποκλειστικός δικαιούχος για την υλοποίηση της Δράσης 1.1.1, που αφορά δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων Νέων Γεωργών. Η σχετική απόφαση ένταξης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων αναρτήθηκε στις 08.03.2017 (αρ. πρωτ. 2413/08.03.2017).

Τα βασικότερα προβλήματα που έπρεπε να επιλυθούν άμεσα ήταν:

- Ο κύριος όγκος των προγραμμάτων κατάρτισης έπρεπε να πραγματοποιηθεί μέσα στο καλοκαίρι, όπου υπήρχαν οι άδειες των εκπαιδευτών και του προσωπικού, οι γεωργικές εργασίες ήταν στο «απώγειό» τους, έπρεπε να εντατικοποιηθούν οι εσωτερικοί έλεγχοι κ.λπ.
- Μεγάλη γεωγραφική διασπορά των υπόχρεων (κυρίως στις νησιωτικές περιοχές της χώρας), γεγονός που δυσχέραινε σε μεγάλο βαθμό τη δημιουργία τμημάτων κατάρτισης.
- Διαφορετική θεματική κατεύθυνση των υπόχρεων (φυτική, ζωική, μελισσοκομία).
- Αναζήτηση πολλών αιθουσών για να «φιλοξενήσουν» τα προγράμματα κατάρτισης. Οι δομές αυτές θα έπρεπε να είναι και πιστοποιημένες, οπότε υπήρξε μια γραφειοκρατική διαδικασία επικοινωνίας για την εξεύρεσή τους με σχολεία, Δήμους, Κοινότητες, Ιδρύματα, ΚΕΚ κ.λπ.
- Αναζήτηση μεγάλου αριθμού πιστοποιημένων εκπαιδευτών.
- Θέματα προσωπικών προβλημάτων των υπόχρεων, που τους εμπόδιζαν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.
- Διοικητικές και οικονομικές «δυσλειτουργίες».

Οι άμεσες ενέργειες που έγιναν προς επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων ήταν:

- Ορισμός περιφερειακών και τοπικών υπευθύνων γεωτεχνικών υπαλλήλων του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ με ταυτόχρονη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ώστε να είναι πιο εύκολη η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης.
- Διαρκής επικοινωνία με τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ προς επιβεβαίωση της λίστας των υπόχρεων, η οποία δυστυχώς συνεχώς τροποποιούνταν.
- Διαρκής επικοινωνία με τοπικούς φορείς και υπηρεσίες για την εξεύρεση αιθουσών δεδομένου ότι οι διαθέσιμες αίθουσες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν ήταν αρκετές ώστε να υλοποιήσουν ταυτόχρονα όλες τις αναγκαίες καταρτίσεις.
- Αναπροσαρμογή όλου του αρχικού σχεδιασμού υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, δεδομένου του πιεστικού χρονοδιαγράμματος.
- Ταυτόχρονη υλοποίηση δεκάδων – εκατοντάδων προγραμμάτων κατάρτισης σε όλη τη χώρα, με αποκορύφωμα τον Αύγουστο κατά τη διάρκεια του οποίου υπήρξαν ημέρες που υλοποιούνταν ταυτόχρονα μέχρι και 157 προγράμματα.
- Κατασκευή ειδικού πληροφοριακού συστήματος για την ορθότερη παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης.
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξεύρεση εξειδικευμένου πιστοποιημένου επιστημονικού εκπαιδευτικού προσωπικού.
- Δύο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξεύρε-

ση εξειδικευμένου προσωπικού με σκοπό την υποστήριξη των προγραμμάτων κατάρτισης.

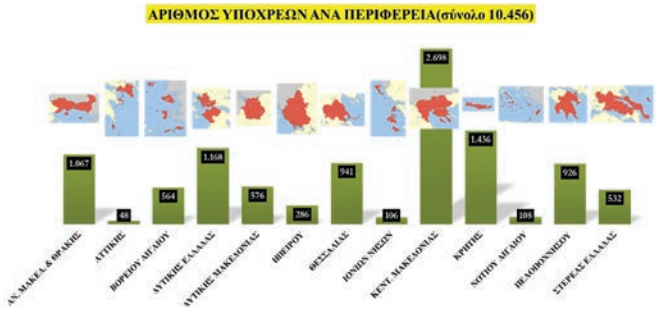

Αριθμός Υπόχρεων «Νέων Γεωργών» ανά υποέργο (Περιφέρεια)

Πιο συγκεκριμένα οι ωφελούμενοι – καταρτιζόμενοι αρχικά ήταν 10.456 Νέοι Γεωργοί. Η Πράξη ολοκληρώθηκε με ένα εξαιρετικά πιεστικό χρονοδιάγραμμα (μόλις 6 μηνών), μέσα στο οποίο συντάχθηκαν, εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν 507 προγράμματα κατάρτισης, 150 ωρών το καθένα (114 ώρες θεωρία και 36 ώρες πρακτική άσκηση). Η δομή της πράξης περιελάμβανε13 Υποέργα, ένα για κάθε Περιφέρεια προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιαιτερότητες κάθε γεωγραφικής περιοχής και να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η κατανομή των υπόχρεων κατάρτισης «Νέων Γεωργών» ανά υποέργο, ενώ στον ακόλουθο Πίνακα φαίνεται η κατανομή των υλοποιηθέντων προγραμμάτων κατάρτισης ανά υποέργο και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης που δόθηκαν στους υπόχρεους αντίστοιχα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	49	1031
ΑΤΤΙΚΗΣ	8	45
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	28	545
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	54	1130
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	28	555
ΗΠΕΙΡΟΥ	15	262
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	47	923
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	5	92
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	123	2600
ΚΡΗΤΗΣ	64	1412
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	8	101
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	48	901
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	30	516
ΣΥΝΟΛΟ	**507**	**10.113**

Υλοποιηθέντα Προγράμματα Κατάρτισης ανά υποέργο (Περιφέρεια) και βεβαιώσεις παρακολούθησης των υπόχρεων «Νέων Γεωργών».

Η διαφορά που εμφανίζεται μεταξύ των υπόχρεων κατάρτισης και των βεβαιώσεων παρακολούθησης (343 άτομα) οφείλεται κυρίως σε περιπτώσεις νέων αγροτών οι οποίοι, είτε δεν ήταν σε θέση να παρευρεθούν στο τόπο υλοποίησης των προγραμμάτων, όταν καλέστηκαν, επικαλούμενοι φόρτο εργασίας ή λόγους ανωτέρας βίας, οπότε και «κόπηκαν» από απουσίες, είτε είχαν απενταχθεί ή είναι σε διαδικασία απένταξης από το έργο, είτε έχουν πάρει απαλλαγή από την κατάρτιση λόγω πτυχίου.

Κατανομή υλοποιηθέντων προγραμμάτων κατάρτισης

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης έχουν σχεδιασθεί από τον ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ ειδικά για τις ανάγκες των «Νέων Γεωργών» και διακρίνονται ανάλογα με την κατεύθυνση – προσανατολισμό της παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τρεις βασικές κατηγορίες: Φυτική παραγωγή, Ζωική παραγωγή και Μελισσοκομία (Μικτή). Στο παραπάνω διάγραμμα εμφανίζεται η κατανομή του συνόλου των 507 υλοποιηθέντων προγραμμάτων κατάρτισης ανά θεματική ενότητα.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και η Κεντρική Υπηρεσία, αυτή την περίοδο βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του κάθε προγράμματος κατάρτισης. Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί, ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί τουλάχιστον 223 προγράμματα κατάρτισης, τα 159 από τα οποία έχουν ήδη αποσταλεί για τον τελικό έλεγχο στη Διαχειριστική Αρχή του ΥΠΑΑΤ (ΕΥΕ-ΠΑΑ). Από εκεί έχουν προωθηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ απ' όπου έχουν πραγματοποιηθεί και οι αντίστοιχες πληρωμές προς τον οργανισμό.

Συγκεντρωτικά λοιπόν ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και η Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης πραγματοποίησε σε χρονικό διάστημα μόλις 6 μηνών:

- 507 προγράμματα κατάρτισης που αντιστοιχούν σε 76.000 περίπου ώρες κατάρτισης.
- Την κατάρτιση 10.408 υπόχρεων (η διαφορά προκύπτει από τους υπόχρεους που πήραν απαλλαγή)
- Τη συνεργασία με 751 εκπαιδευτές, από τους οποίους οι 644 ήταν πιστοποιημένοι από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
- Τη σύναψη περισσότερων από 6.000 συμβάσεων συνεργασίας με τους εκπαιδευτές.
- Τη συνεργασία με περισσότερες από 2.500 αναθέσεις σε περισσότερους από 500 προμηθευτές για αναλώσιμα εκπαιδευτικής δραστηριότητας, γραφική ύλη, είδη διατροφής, καθαριότητα, ενοικιάσεις αιθουσών κ.λπ.
- Ενημερωτικές ημερίδες στο σύνολο των περιφερειών της χώρας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, συνεχή προβολή σε κοινωνικά δίκτυα, σε ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και σε διάφορες μεγάλες εκθέσεις, όπως η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 10.194.600,00 €.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γενική, Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 111 45 Αθήνα, τηλ.: 210 839 2189, e-mail: katartisi.elgo@gmail.com
